LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°119-26 SU19

CLIENTE : Scala Diseño y Construccion S.a.C.
DIRECCIÓN ** : Av. de la Roca de Vergallo Nro. 493 Int. 1811
PROYECTO ** : AMPLIACION, REMODELACION Y DEMOLICION PARCIAL DEL ALMACEN SEDE VILLA EL SALVADOR AMERICA MOVIL S.A.C
UBICACIÓN ** : AV. SOL 2246 DISTRITO VILLA EL SALVADOR - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 451- 26
FECHA EMISIÓN: : 2026-03-06

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³)) ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : C-PROPIO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 46-AG-26
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-03-04
FECHA DE EJECUCIÓN : 2026-03-04

Ensayo de Granulometria: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designaciòn de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	12	12	88
3/8 in (9.5 mm)	18	30	70
No. 4 (4.75 mm)	15	45	55
Menor (No. 4)	55	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad especifica de sólido del suelo	2,75	2,75	2,75	2,75
contenido de agua saturación (%)	10,3	8,3	8,1	10,5

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda					
Prueba Nº	**1**	**2**	**3**	**4**	
Número de capas	5	5	5	5	
Número de golpes	56	56	56	56	
Densidad húmeda (g/cm^3)	2,158	2,313	2,390	2,350	
Contenido humedad - Densidad Seca					
Contenido de Humedad suelo (%)	0,6	3,3	6,3	10,1	
Densidad Seca (g/cm^3)	2,145	2,238	2,249	2,135	
Peso unitario seco del suelo kN/m^3	21,04	21,95	22,06	20,94	

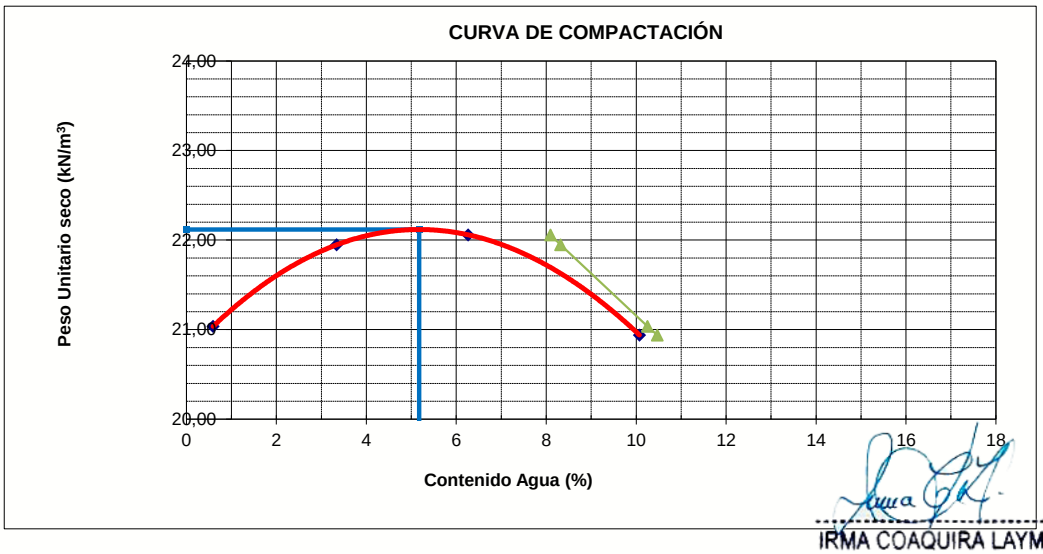

Método de Ensayo
C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
22,12 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
5,2 %

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°119-26 SU19

CLIENTE : Scala Diseño y Construccion S.a.C.
DIRECCIÓN ** : Av. de la Roca de Vergallo Nro. 493 Int. 1811
PROYECTO ** : AMPLIACION, REMODELACION Y DEMOLICION PARCIAL DEL ALMACEN SEDE VILLA EL SALVADOR AMERICA MOVIL S.A.C
UBICACIÓN ** : AV. SOL 2246 DISTRITO VILLA EL SALVADOR - LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 451- 26
FECHA EMISIÓN: : 2026-03-06

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra	ALTERADO
- Tamaño máximo de la particula (in.)	1 1/2
- Forma de la particula	ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo	NO	
- Método de Preparación	HUMEDO	
- Tipo de Apisonador	MANUAL	
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19	4,1	-
- Clasificación muestra ASTM D2487-17$^{\varepsilon 1}$	-	-
- Tamiz para la selección del Metodo (in)	3/4	

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe
